

Российская Федерация  
 Администрация муниципального образования  
 городской округ «Смирныховский»  
 Сахалинской области  
 Муниципальное казенное учреждение  
 «Управление образования администрации  
 муниципального образования городской округ  
 «Смирныховский» Сахалинской области  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
 ШКОЛА с. БУЮКЛЫ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «СМИРНЫХОВСКИЙ»  
 САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**  
 694320 с.Буюклы, ул. Школьная,14  
 тел\факс 8 (42452 ) 27-3-20  
 e-mail: bsosh60@mail.ru  
 ИНН 6514000232 ОГРН 1026500917376

Сахалинское управление Ростехнадзора

« 15 » марта 2019 г. №

Направляем в Ваш адрес ответ на исполнение Предписания № П-06-249\63-260Э от 27.09.2018 г.




| № пп | Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа                  | Отметка об исполнении  |
|------|---|--|
| 1    | Приказом от 03.09.2018 ответственным за электрохозяйство назначено слесарь-электрик Серебряков Е.А., при этом не назначен его заместитель               | Приказом по школе № 54 от 12.03.2019г. «О назначении ответственного за электрохозяйство» (копия прилагается)                         |
| 2    | Не составлен список должностей инженерно-технических работников и электротехнического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности | Приказом по школе № 273 от 28.09.2018г. утвержден перечень должностей и профессий по группам электробезопасности (копия прилагается) |
| 3    | Не предоставлены протоколы приемо-сдаточных испытаний понижающего трансформатора 220/42 В в кабинете физики   | Выполнено Протокол № 141 от 06.02.2019 г. выдано Управлением по технологическому надзору Ростехнадзора по Сахалинской области        |
| 4    | Не составлен перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации  | Приказом по школе № 13 от 31.01.2019г. утвержден перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации                           |
| 5    | Не составлен список профессий и рабочих мест требующих отнесения персонала к 1 группе по электробезопасности  | Приказом по школе № 274 от 28.09.2018г. утвержден список профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к 1 группе по       |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | электробезопасности (копия прилагается)  |
| 6  | Не проводится проверка срабатывания защиты при коротких замыканиях, для проверки уставок расцепителей автоматических выключателей  | Выполнено Протокол № 141\2, 141\4 от 06.02.2019г. выдано Управлением по технологическому надзору Ростехнадзора по Сахалинской области (копия прилагается)  |
| 7  | Не снабжены бирками в начале и конце линии электрические кабели (Помещение ВРУ)  | Выполнено фото прилагается   |
| 8  | Не нанесены порядковые номера на опоры воздушной линии наружного освещения территории школы  | Выполнено фото прилагается   |
| 9  | Не представлены протоколы приемо-сдаточных испытаний устройств защитного отключения  | Выполнено Протокол № 141\3 от 06.02.2019 г. выдано Управлением по технологическому надзору Ростехнадзора по Сахалинской области                            |
| 10 | Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки освещения, испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабеля и заземляющих устройств проводится реже й раза в 3 года (протоколы проверки заземляющих устройств от 2011 г.) | Выполнено Протокол № 141, № 141\1 от 06.02.2019 г. выдано Управлением по технологическому надзору Ростехнадзора по Сахалинской области (копия прилагается) |
| 11 | Не выполнены надписи указывающие назначения присоединений на панелях щитов РУ-0,4 кВ. (помещение ВРУ)  | Выполнено фото прилагается   |
| 12 | Не выдерживаются нормы и периодичность электрических испытаний электрозащитных средств (указатель напряжения, диэлектрические перчатки. Инструмент ручной изоляции)  | Выполнено. Протокол № 10,11,12 от 18.02.2019 г. выдано Управлением по технологическому надзору Ростехнадзора по Сахалинской области (копия прилагается)    |
| 13 | Не осуществляется проверка устройств защитного отключения на работоспособность в соответствии с рекомендациями завода изготовителя и нормами испытаний   | Выполнено Протокол № 141\5 от 06.02.2019 г. выдано Управлением по технологическому надзору Ростехнадзора по Сахалинской области (копия прилагается)        |
| 14 | Не указаны в договоре на электроснабжение и не отражены на электрической схеме сведения о наличии резервной электростанции (ТЭП)   | Выполнено  |
| 15 | На рукоятке управления РУ-0,4 кВ гаражного бокса нет надписей указывающей операции, для которой она предназначена (ВКЛ и ОТКЛ)   | Выполнено фото прилагается   |

Директор школы В. Д. Рудьков





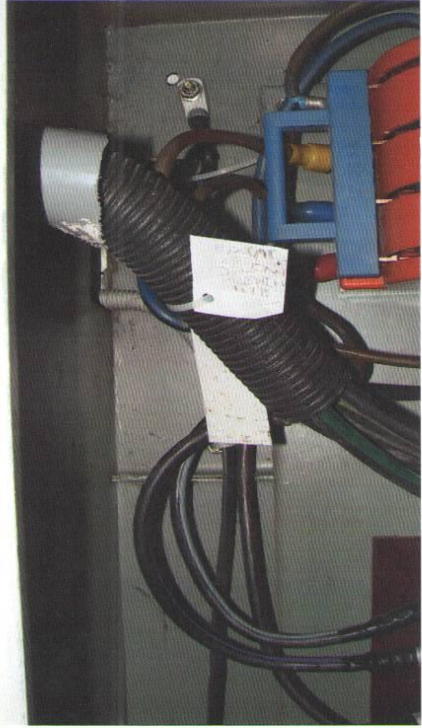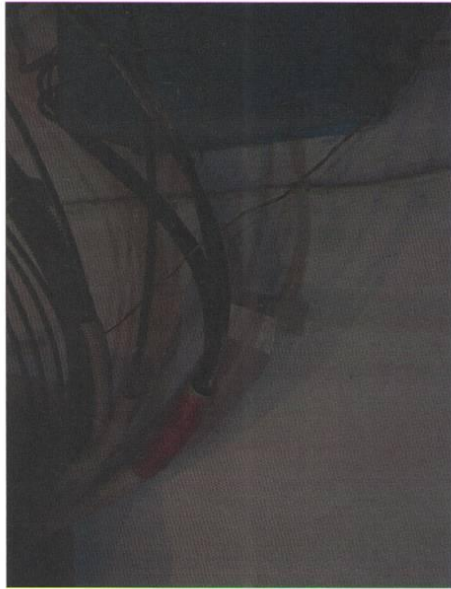
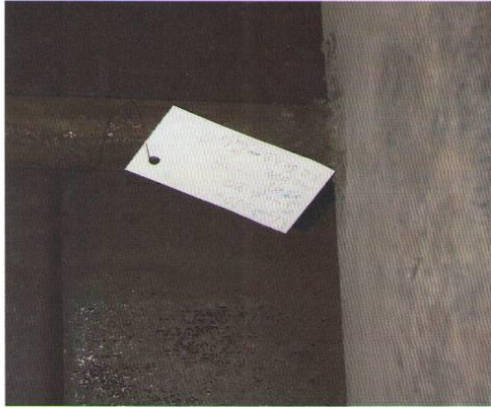


n.11.




n.15.

н. II

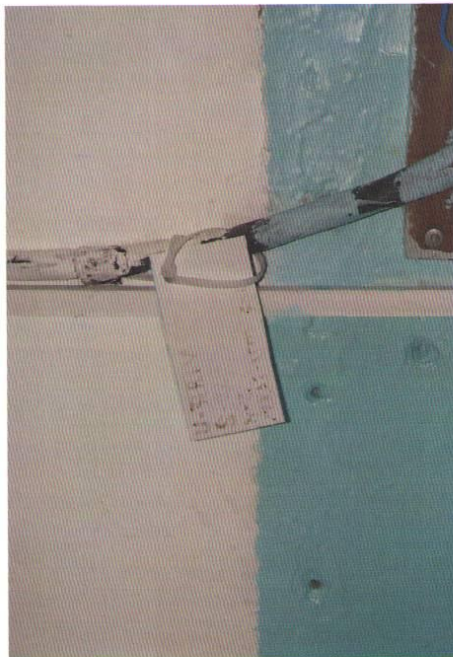
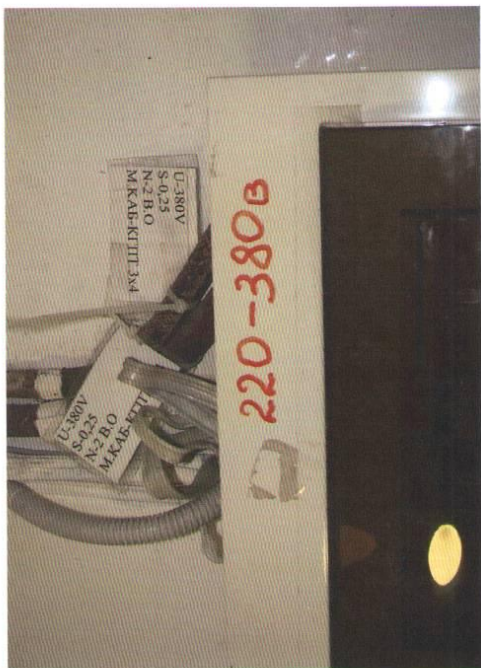


н. II

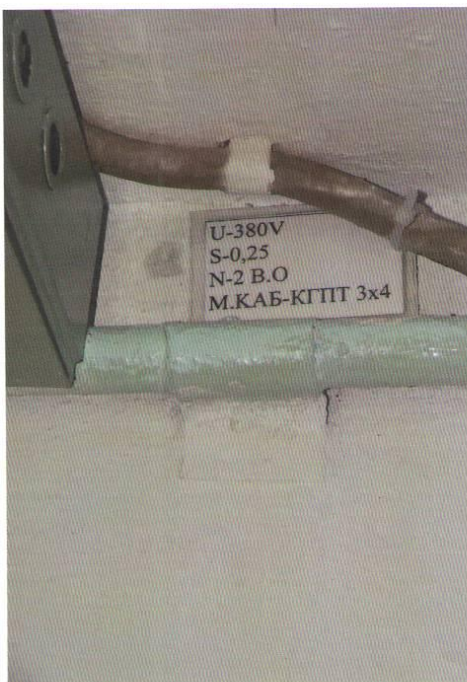



№ 7. Присоединение

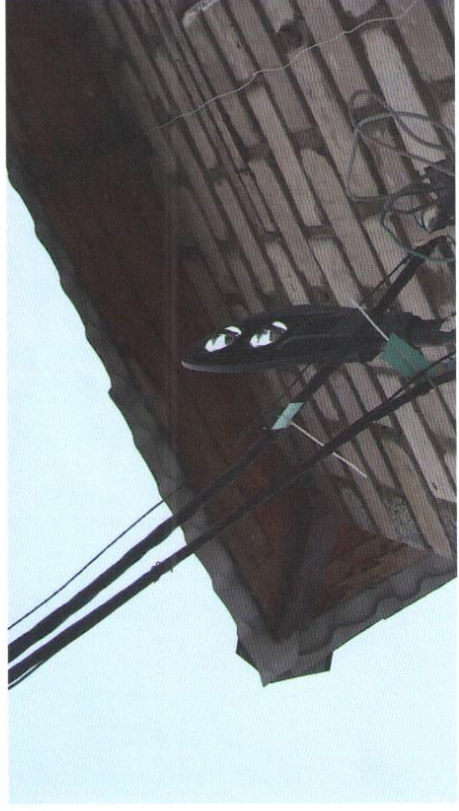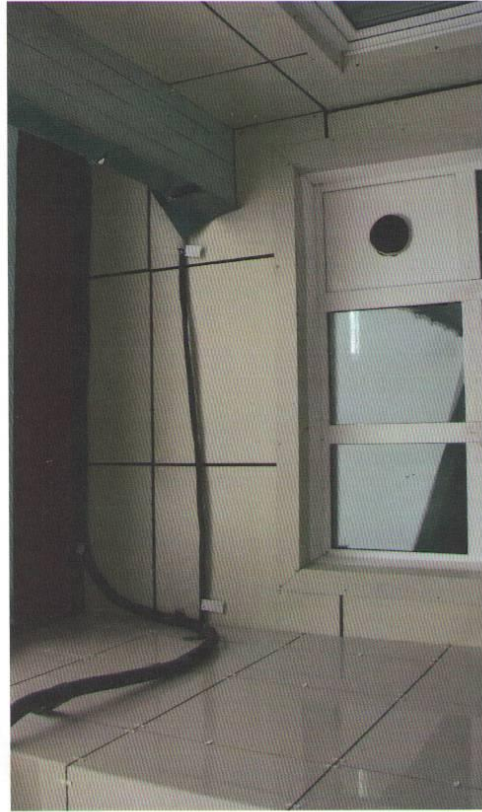

№ 7.
